

業 務 報 告

(제97회 제1차 정례회)



2003. 6

建設交通局

보 고 순 서

□ 일 반 현 황-----1

□ 교 통 행 정 과-----3


□ 교 통 지 도 과-----15

□ 토 목 과-----23

□ 치 수 과 -----39

일 반 현 황

□ 기 구 ----- 4개과 15개팀

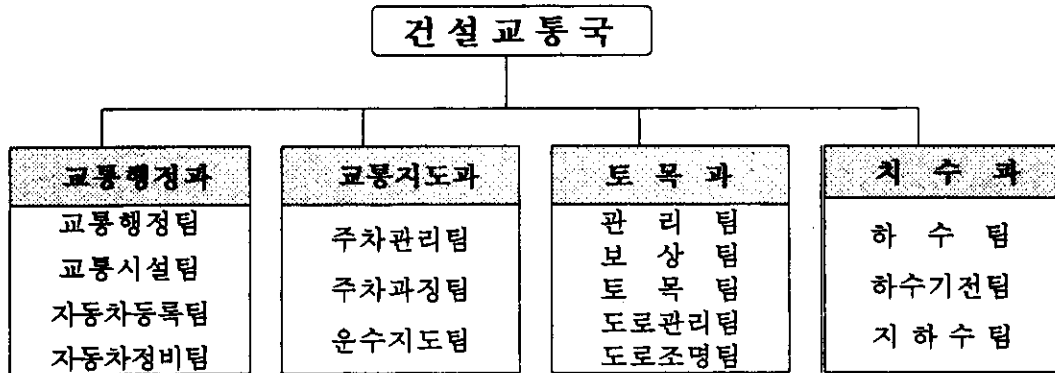


□ 인력현황

구 분	직 급	총 계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능 고 전 문
총 계	정 원	186	1	4	20	27	33	8	93
	현 원	193	1	4	17	39	23	11	98
교통행정과	정 원	30	1	1	5	6	9		8
	현 원	31	1	1	4	12	4	1	8
교통지도과	정 원	65		1	4	5	8	1	46
	현 원	64		1	3	9	4	1	46
토 목 과	정 원	46		1	6	12	10	4	13
	현 원	50		1	5	14	9	6	15
치 수 과	정 원	45		1	5	4	6	3	26
	현 원	48		1	5	4	6	3	29

교통행정과

□ 인력현황

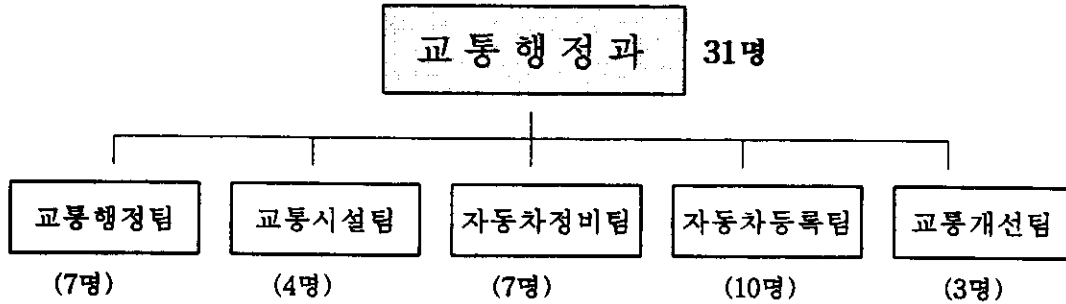

교통행정팀
(7명)

교통시설팀
(4명)

자동차정비팀
(7명)

자동차등록팀
(10명)

교통개선팀
(3명)

구분	계	행정직							기술직				기능직		교통신문직	교용직
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	6급	7급	8급	소계	9등급		
정원	30	19	1	1	4	6	7		3	1		2	1	1	3	4
현원	31	19	1	1	3	9	4	1	4	1	3		1	1	3	4
과부족	+1				-1	+3	-3	+1	+1		+3	-2				

□ 장비현황

구분 계	복사기	팩시 밀리	동사기	컴퓨터	LCD 모니터	레이저 프린터	목재 캐비닛	모빌렉	자동차
93	2	2	1	38	16	10	22	1	1

□ 민원현황

○ 차량 등록

(2003. 5.31현재)

계	차량등록현황					이륜차
	소계	승용차	승합차	화물차	특수차	
115,047	100,925	76,630	8,881	15,324	90	14,122

○ 자동차 민원처리

계	신규	변경	계당	검사	말소	이전	압류	증명 발급	원부 발급	기타
40,618	942	4,812	640	28	258	488	10,070	297	22,460	623

□ 기 타

마을버스	시내버스	택시		자전거 보관소	도로안내 표지판	보행자 안내표지판
		법인	개인			
11업체 17노선 88대	1업체 43대	8업체 667대	1,318대	20개소 759대	269개	39개

1. 주택가 공영주차장 건설

주택가 주차난 완화를 위해 지역단위 공영주차장을 건설하여 주차질서 확립 및 주민생활 환경을 개선하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 사업규모 또는 주요내용
 - 3개동 3개소 4,798㎡(1,454평)
 - 공덕1동(1,007㎡), 망원1동(991㎡), 합정동(2,800㎡)
- 추진현황 :
 - 공덕1-1주차장건설 : 3층4단 82면
 - 망원1-1주차장건설 : 2층3단 69면
 - 합정동 잠두봉 소공원지하주차장건설 93면

□ 세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 공덕1-1 주차장건설 : 80% 공정
- 망원1-1 주차장건설 : 15% 공정
- 잠두봉 소공원 주차장건설 : 실시 설계중

□ 소요예산 : 5,772백만원(시비:2,219, 구비:3,553)

- 공덕1-1 주차장건설 : 1,786백만원(시비: 0, 구비:1,786)
- 망원1-1 주차장건설 : 816백만원(시비: 0, 구비: 816)
- 잠두봉 소공원 주차장건설 : 3,170백만원(시비:2,219, 구비 951)

□ 향후추진계획

- 공영주차장 완공시 감정평가후 매입

2. 거주자 우선주차제 확대 시행

이면도로 주차구획선 설치 및 일방통행제 실시 사업을 통하여 주택가 주차공간 확충 및 주차유료화 시행으로 주택가 주차질서를 확립하고자 거주자 우선주차 지역을 제3권역(상수동, 창전동, 서교동일부, 합정동일부, 동교동일부)으로 확대시행

□ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 9월
- 사업규모 또는 주요내용 : 주차구획선 1,357면, 시설물 463개 설치
- 추진방법 :
 - 주민설명회 및 의견수렴(5개동)
 - 주민의견수렴에 따른 현장조사 및 설계변경
 - 관련기관 협의(마포경찰서, 서울지방경찰청)
- 사업비 : 741백만원(국비 - , 시비 253 , 구비 488)
(기투자: 253, 2003예산: 128, 장래: 360)

□ 세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 2003.3 : 3권역 관련기관 협의 및 주민설명회 개최
- 2003.4~5 : 주민의견 수렴에 따른 현장조사 및 설계도면 수정
- 2003.6(현재) : 관련기관 협의(마포경찰서, 서울지방경찰청)
교통규제 사항 및 교통시설물 협의

□ 소요예산 : 128백만원

□ 향후추진계획

- 2003.7~8 : 주차시설 정비확충 및 교통시설물 설치
- 2003.9 : 거주자우선주차제 시행

3. 내집주차장 설치 지원

주택가 주차난 완화를 위하여 '99년 11월부터 추진하고 있는 “내집주차장 갖기운동” 사업의 지속적인 추진을 위하여 2003년에는 내집주차장 설치자에게 공사비를 확대지원 하여 보다 활성화 하고자 함.

사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 사업규모 또는 주요내용 : 내집주차장 150면 설치지원
- 추진방법 :
 - 내집주차장설치 (현장방문:300가구)
 - 내집주차장갖기 홍보
 - 내고장마포, 지역신문 등에 홍보 : 10회
 - 단독주택 밀집지역에 홍보물제작배포 및 프래카드 제작 홍보
 - 각종 세무고지서 이면 여백, 구청정문 전광판, 구 홈페이지등에 홍보
- 사 업 비 : 1,573백만원(기투자:322, 2003예산:201, 장래:1,050)

세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 내집주차장설치
 - 현 장 방 문 : 135가구
 - 설 치 신 청 : 89/54(면수/가구)
 - 설 치 완 료 : 65/36(면수/가구)
- 내집주차장갖기 홍보
 - 홍보물 제작 배포 : 3만매
 - 내고장마포, 지역신문등에 홍보 : 5회

소요예산

- 내집주차장설치비 지원 : 201백만원(시비 70%, 구비 30%)

향후 추진계획

- 홍보활동 강화

4. 도로안내표지 정비(관리)

도로안내표지 일제정비사업 완료에 따라 새로이 정비된 도로안내체계와 시인성이 향상된 상태를 상시 유지할 수 있도록 관리함으로써 시민편의를 제공하고 교통사고 예방에도 기여하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 11월
- 사업규모
 - 도로안내표지 유지관리 : 지주도장 및 판세척 266개소
 - 도로안내표지 유지보수
- 추진방법 :
 - 도로안내표지 지주도장 및 판세척 정비대상 물량조사
 - 정비대상 물량에 대한 공사설계 및 발주
- 사업비 : 57백만원(구비)

세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 2003. 4. 29 : 도로안내표지 정비시행 방침
 - 정비대상 물량에 대한 공사설계 및 발주
- 2003. 5. 2 : 입찰의뢰
- 2003. 5. 22 : 계약(태정개발 김용순)
 - 공사기간 : 2003.5.22 ~ 6.26
 - 계약금액 : ₩33,833,500원

소요예산

- ₩54,000천원

향후 추진계획

- 시인성 유지를 위한 지속적인 유지관리

5. 무단방치차량 처리

도로변이나 공터, 주택가 등에 방치되어 구민불편 및 도시미관 저해차량에 대한 지속적인 정리로 교통소통은 물론, 구민불편을 해소코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 사업규모 또는 주요내용 : 무단방치차량 처리
- 추진방법
 - 상·하반기 일제정리(년2회)
 - 방치차량 현장확인 및 강제전인
 - 자동차자진처리명령서발송 ● 법인차량 등기부 열람
 - 차량소유자 및 점유자 현주소추적 우편물 발송
 - 방치차량 강제폐차
 - 직권말소 후 범칙자 수사 및 사건이송
- 사업비 : 비예산

□ 세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 방치차량 처리현황
 - 총 건수 : 389건
 - 자진처리 : 263건
 - 강제전인 : 53건
 - 처리 중 : 73건
- 상반기방치차량 직권말소 : 50건
- 범칙자 처리현황
 - 총 건수 : 254건
 - 내사종결 : 46건(32,600천원 징수)
 - 사건송치 : 90건 - 사건 이송: 67건 - 내사 중 : 51건

□ 향후 추진계획

- 전년도 이월분 직권말소 대상 : 62건
- 예정일자 : 2003.06.18이후

6. 여성운전자 자동차정비 무료교육

여성운전자를 대상으로 자동차 일상점검 생활화 및 자동차 고장의 사전 예방, 사고나 고장시 응급조치 등을 이론 및 실습을 통한 교육을 실시함으로써 여성운전자의 자동차 정비능력과 안전의식을 고취하기 위함

□ 사업개요

- 사업기간 : 상, 하반기 각 3일간 실시(5월, 10월)
- 사업규모 또는 주요내용 : 여성운전자 자동차정비 무료교육(각 100명)
- 추진방법 :
 - 여성운전자 자동차정비 무료교육 : 상, 하반기 각 3일 실시(년2회)
 - 홍보계획 : 집중홍보 (3~4월, 8~9월)
 - 교육장소 : 이론교육(구청대강당), 실습교육(한강 망원지구 주차장)
- 사업비 : 680천원(구비)

□ 세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 추진기간 : 2003. 5. 26.~ 5. 28.(3일간)
- 주요내용 : 여성운전자 자동차정비 무료교육(113명)
- 교육장소 : 이론교육(구청대강당), 실습교육(한강망원지구 주차장)

□ 소요예산 : 680천원

- 강 사 료 : 280천원
- 음료수대 : 200천원
- 기 타 : 200천원

□ 향후추진계획

- 사업기간 : 하반기 3일간 실시
- 주요내용 : 여성운전자 자동차정비 무료교육(100명 예정)
- 홍보계획 : 집중홍보(8~9월)
- 교육장소 : 이론교육(구청대강당), 실습교육(한강망원지구 주차장)

7. 자동차정비업소 지도점검

자동차정비 등록업체의 정비실태 및 무등록업소의 자동차 불법정비 행위 등에 대한 지속적인 지도점검·단속으로 자동차 정비질서를 확립하여 자동차 안전도 확보 및 이용시민의 편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 1월 ~ 12월
- 사업규모 또는 주요내용 : 자동차정비업소 지도점검(대상 : 218개소)
- 추진방법 :
 - 자동차(등록)정비업소 지도점검
 - 분기별 50개소 점검실시(년1회)
 - 자동차(무등록)정비업소 합동지도점검
 - 불법정비 행위 및 성행지역 합동점검(년6회 이상)
- 사업비 : 비예산

□ 세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 자동차(등록)정비업소 지도점검 : 82개소 (38%)
- 자동차(무등록)정비업소 합동지도점검 : 1회(17%)

□ 소요예산 : 비예산

□ 향후추진계획

- 자동차(등록)정비업소 지도점검
 - 7월~9월(60개소), 10월~12월(76개소)
- 자동차(무등록)정비업소 합동지도 점검
 - 7월~9월(2회), 10월~12월(3회)

8. 교통유발부담금 부과·징수

교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자로부터 교통유발부담금을 징수하여 세수증대에 기여하고, 도시교통의 원활한 소통으로 교통편의 증진에도 이바지 하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 5월 ~ 12월
- 사업규모 또는 주요내용 : 2003년 부과-1,300건 1,320백만원(예상)
*징수액의 10%마포구 수입
- 추진방법 :
 - 교통유발부담금 부과·징수
 - 부과계획 수립 및 조사원 모집
 - 부과대상 시설물 현장조사 및 전산입력
 - 고지서발송(납부기한:9월30일)
 - 체납자 독촉고지서 발송
 - 체납자 채권확보 등 재산압류
- 사업비 : 2,818천원

세부 추진실적(2003. 6.30현재)

- 부과대상 시설물 현장조사 완료 : 1,217건
- 신규부과대상 시설물 현장 조사 : 80건(예상)
- 시설물 조사표 전산입력 4개동완료

소요예산

- 조사요원 임금 : 2,818천원

향후추진계획

- 신규부과대상 시설물 현장조사 완료 : 7월말
- 부과예고 안내문 발송 : 7월중
- 부과대상 전산자료 입력완료 : 8월중
- 고지서 발송 : 9월초(납기 : 9.30)

9. 세외수입채납 정리계획

의무 불이행 등으로 부과되는 세외수입(과태료 등)의 채납처분에 대하여 강력한 채납정리를 실시하여 구 수입 증대에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 년중
- 사업규모 또는 주요내용 : 과태료, 과징금 채납정리

□ 향후추진계획

- 고액채납자(300천원 이상자) 부동산,급여 등 대체압류 추진


□ 채납독려 및 징수현황 (2003. 4.30현재)

- 2003년 신규압류 : 3,277건 / 560,283천원(누계17,366건 / 4,003,576천원)
(단위 : 천원)

	과태료	과징금	징수	과태료	과징금	징수	과태료	과징금	징수
총 계	35,543	6,122,980	4,330	334,394	31,213	5,788,586	17,366	4,003,576	1,785,010
현년도소계	7,451	743,881	2,569	164,342	4,882	579,039	1,468	231,471	347,568
자관법	876	107,820	735	81,950	141	25,870	84	15,522	10,348
검사	2,571	307,130	858	52,360	1,713	254,770	707	105,220	149,550
책임보험	4,002	327,931	974	29,532	3,028	298,399	677	110,729	187,670
작출제									
과징금	2	500	2	500					
과년도소계	28,092	5,379,599	1,761	170,052	26,331	5,209,547	15,898	3,772,105	1,437,442
자관법	3,127	1,032,545	36	7,840	3,091	1,024,705	2,565	850,505	174,200
검사	12,886	2,754,245	287	39,660	12,599	2,714,585	10,784	2,323,684	390,901
책임보험	11,102	1,430,059	878	46,602	10,224	1,433,457	2,385	577,416	856,041
작출제	913	45,650	512	25,600	401	20,050	153	7,650	12,400
과징금	64	67,100	48	50,350	16	16,750	11	12,850	3,900

교통지도과

1. 기 구(3개팀)



2. 인 력

구 분	계	일 반 직						기능직	지도원
		4급	5급	6급	7급	8급	9급		
정 원	65		1	4	5	8	1	21	25
현 원	64		1	3	9	4	1	21	25

* 공익근무요원 : 145명

3. 장 비

구 분	차 량				비디오 카메라	디지털 카메라	단 속 초 소
	계	마티즈	타우너	전인차			
계	10	8	1	1	40	115	5
불법주차단속	10	8	1	1	.	115	
버스전용차단속	40	.	5

4. 주차장 및 버스전용차로

주차장

유 형	개소	면수	비 고
공영주차장	계	19	- 상가 및 업무용 빌딩이 밀집된 지역에 설치하여 외래방문객이 이용할 수 있도록 한 주차장
	마포구	15	
	서울시	4	
거주자 우선주차장	7개동 및 4개소	4,377	- 주택가 이면도로에 설치하여 주민들의 주차편의를 제공하고자 설치한 주차장
민영 노외주차장	108	3,426	- 민간인이 설치하여 요금을 자율 결정하여 운영
건축물 부설주차장	8,308	70,141	- 주거용주택 및 상업용건물에 부설된 주차장

버스전용차로

- 5개노선 8.9km(성산로, 마포로, 양화로, 신촌로, 만리로)

1. 주·정차 질서 확립

원활한 교통소통 및 도로안전을 확보하기 위하여 지속적인 주·정차 단속 및 주차질서 홍보활동 전개로 시민생활 편익을 도모하고 깨끗한 도심 환경을 조성코자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 불법 주·정차 단속
 - 주차질서 확립 캠페인 전개
 - 학교주변 주차질서 자원봉사대 운영
 - 주차질서 취약지역 야간단속 강화

□ 세부 추진실적(2003.5.31현재)

- 불법 주·정차 단속
 - 목 표 : 120,000건
 - 실 적 : 55,000건
- 주차질서 확립 캠페인 전개
 - 제도횟수 : 2회
 - 장 소 : 공덕동R, 홍대입구
 - 참여인원 : 300명(녹색어머니회, 모범운전자회 등)

□ 소요예산

- 사업비 : 45.4백만원

□ 향후 추진계획

- 불법 주·정차 단속 지속 실시로 원활한 교통소통 및 도로안전 확보
- 주차질서 취약지역 야간단속 강화
- 학교주변 주차질서 자원봉사대 운영
- 주차질서 확립 캠페인 지속 전개

2. 공영주차장 관리

공영주차장 수탁관리자에 대한 정기적인 지도·점검 및 시설물 정비로 공공성과 수익성은 향상은 물론 이용 시민에게 편의를 제공하고 주차난 해소에 기여하고자 함.

사업개요

- 사업기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 공영주차장 15개소 979면
- 수탁관리자 : 마포개발공사

세부 추진실적(2003.5.31현재)

- 주차장 운영수입
 - 목표액 : 1,914백만원
 - 실적 : 721백만원
- 수탁관리자 지도·점검 실시 : 2003. 5월
- 시설물 정비
 - 일시 : 2003. 6월
 - 대상 : 주차장 이용 안내표지판 11개

소요예산

- 사업비 : 799백만원

향후 추진계획

- 공영주차장 위탁관리자에 대한 수시 지도·점검 확행
- 시설물에 대한 지속적인 정비로 주민편의 제공
- 공공성과 수익성 향상을 위한 방안 강구
- 수탁관리자에 대한 교육으로 대민 친절행정 구현

3. 거주자우선주차제의 효율적인 운영

주택가 이면도로의 무질서한 주차로부터 긴급차량과 보행자의 통행권을 확보하고자 거주자우선주차제를 효율적으로 운영하여 이면도로 주차난 해소에 기여하고자 함.

사업개요

- 사업기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 제2권역 7개동 및 4개소(주차면수 : 4,377면)
 - 망원1·2동, 연남동, 성산1동, 서교동일부, 동교동일부, 합정동일부
 - 성산2-1공영주차장, 한서공영주차장, 공덕1-2공영주차장, 망원2-1공영주차장
- 수탁관리자 : 마포개발공사

세부 추진실적(2003.1/4분기)

- 우선주차제 운영수입
 - 목표액 : 2,048백만원
 - 실적 : 410백만원
- 수탁관리자 지도·점검 실시 : 2003. 5월

소요예산

- 사업비 : 988백만원

향후 추진계획

- 수탁관리자에 대한 수시 지도·점검
- 민원의 신속한 처리
- 주차구획의 효율적인 활용 방안 강구

4. 건축물 부설주차장 관리

건축물 부설주차장의 적정사용과 주·야간 개방을 적극 유도하여 부족한 주차공간을 확보하고 준법의식 고취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 사업규모
 - 건축물 부설주차장 총 8,308개소 70,141면

□ 세부 추진실적(2003.5.31현재)

- 부설주차장 상반기 점검 실시
 - 기 간 : 2003. 2. 17 ~ 4. 30
 - 개 소 수 : 2,462개소(거주자우선주차시행 7개동)
 - 점검결과
 - 위반건수 : 127개소
 - 위반내용 : 무단용도변경 등
 - 처리계획 : 미시정 건물주 고발조치

□ 소요예산

- 사업비 : 11.7백만원

□ 향후 추진계획

- 부설주차장의 주·야간 개방을 적극 추진
- 지속적인 지도·점검으로 부설주차장을 적정하게 사용토록 유도
- 부설주차장 전산화 작업 추진

5. 체납과태료(과징금) 징수계획

주정차과태료, 버스전용차선위반과태료, 운전자과태료 및 운수과징금 등의 체납징수활동을 연중 체계적이고 지속적으로 전개하여 세외수입 증대를 통한 구 재정자립 확충에 기여코자함

사업개요

- 사업기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 사업규모
 - 총체납액 : 478,759건/18,502백만원
 - 징수목표 : 47,875건/1,850백만원
- 사업내용
 - 체납징수 전담반 구성운영 : 3개반 7명
 - 중점체납 일제정리기간 운영 : 5월, 11월
 - 채권 미확보 체납자 시효결손처리

세부 추진실적(2003.4.30현재)

- 체납징수실적
 - 목 표 : 47,875건/1,850백만원
 - 실 적 : 14,648건/ 610백만원
- 체납차량 압류
 - 실 적 : 19,527건/802,540천원
- 채권미확보 차량 시효결손
 - 실 적 : 144건/30,500천원

소요예산

- 사업비 : 36백만원

향후 추진계획

- 체납징수활동을 연중 체계적이고 지속적으로 전개
- 세외수입 증대를 통한 재정책확 방안 모색

6. 사업용차량 운송질서확립

운송사업체 및 사업용 차량에 대한 지속적인 제도·단속을 통하여 교통의 원활한 소통과 승객의 안전을 도모코자함.

사업개요

- 사업기간 : 2003.1월 ~ 12월
- 운송사업체 현황

구분	합계	시내버스	전세버스	마을버스	택시	화물	대여사업
업체	60	1	2	11	7	15	24
차량수	6,091	71	65	88	589	1,388	3,890

○ 중점단속사항

- 시내·마을버스 : 임의노선변경, 임의결행, 무정차 통과, 정류장질서문란 등
- 택시 : 승차거부, 합승, 부당요금징수, 지정복미착용 등
- 기타 : 화물차의 계약사항 미이행, 자가용 유상운송행위 등

세부 추진실적(2003.5.31현재)

- 법규위반차량 지도·단속 실적
 - 목표 : 1,000건
 - 실적 : 338건
- 운수사업체 지도·점검(상반기)
 - 점검횟수 : 1회(5월)
 - 대상업체 : 57업체

소요예산 : 비예산

향후 추진계획

- 지속적인 제도·단속을 통하여 원활한 교통소통 및 승객안전 도모

7. 버스전용차로 위반 차량 단속

대중교통 수단인 버스의 원활한 소통과 이용시민의 편익을 증진 도모하기 위하여 버스전용차로 위반차량 단속을 지속적으로 실시하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 년 중
- 사업규모
 - 단속목표 : 14,000건
 - 단속인원 : 17명 (*공익요원 32명)
 - 단속범위 : 5개노선(성산로, 양화로, 신촌로, 마포로, 만리로)
 - 단속지점 : 7개지점 (구청앞, 동원빌딩앞, 조선일보앞, 영진식품앞, 정원빌딩앞, 아현초등앞, 신덕교회앞)

세부 추진실적(2003.5.31현재)

- 버스전용차로 위반차량단속
 - 목 표 : 14,000건
 - 실 적 : 8,700건

소요예산 : 비예산


향후 추진계획

- 버스의 원활한 소통과 이용시민의 편익을 증진을 위하여 단속을 지속적으로 실시

토 목 과

I. 일반현황

□ 기 구

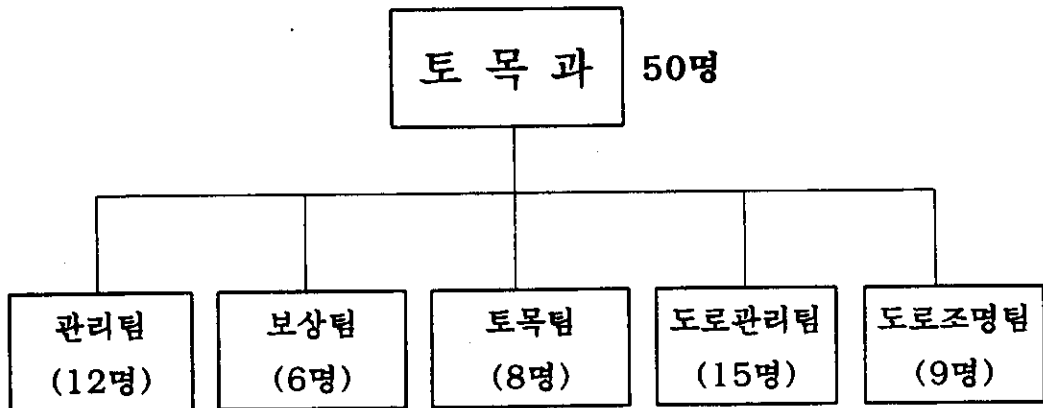

□ 인력현황

구 분	계	일반직					기능직	교용직
		5급	6급	7급	8급	9급		
정 원	46	1	6	12	10	4	11	2
현 원	50	1	5	14	9	6	14	1

□ 장비현황

품명	규격	단위	수량	비고
도로관리차	6톤	대	1	(제설차)
덤프차	4.5t	대	1	
	2.5t	대	1	
타이탄	2.5T	대	3	
더블캡	1t	대	1	
유니목		대	2	
사다리차	12M	대	1	
오토바이	50cc	대	1	
	100cc	대	2	

□ 도로현황

도 로								
도로연장 (m)	도로면적 (㎡)	주거가능 면적 (km ²)	도로율 (%)	포장면적 (㎡)	포장연장 (m)	포장율 (%)	조명시설	
							가로등	보안등
410,480	3,842,767 (1,162,431㏊)	14.38	26.72 (사:21.38)	3,842,767 (1,161,431㏊)	410,480	100	3,090본	10,240본

II. 2003년 주요업무 실적 및 추진계획

1. 사업총괄

1) 도로건설사업 현황 : 33건 16,576.5 백만원

구분	계		진행		완료	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	33	16,576.5	26	14,931.5	7	1,645
시비	8	5,688	6	5,478	2	210
구비	25	10,888.5	20	9,453.5	5	1,435

2) 보상추진 현황 : 7개 사업 9,852 백만원

구분	계		진행		완료	
	보상 건수	금액	보상 건수	금액	보상 건수	금액
계	230	9,852	229	9,811	1	41
시비	164	5,717	164	5,715		
구비	66	4,137	65	4,096	1	41

3) 공공용지 점용료부과 및 징수현황

(단위:백만원)

구분	점용료 부과		징수실적		징수율(%) (금액대비)	비고
	건수	금액	건수	금액		
계	2,858	2,911	2,424	2,715	93%	
시세	897	1,604	763	1,499		
구세	1,961	1,307	1,661	1,216		

4) 도로점용 시설물정비 및 관리현황

(단위:백만원)

구분	대 상		징수 및 정비실적		비고
	건수	금액	건수	금액	
변상금부과(추인)	4	26	4	26	100%
사실표지판 정비	416 건		186 건		45%

2. 완료사업

1) 도로건설사업 : 7 건 1,645백만원(완료)

연번	사업명	공사개요	사업비 (백만원)	추진실적	공정	비고
1	간선도로포장개선사업	· 만타재길보도장비 및 방호울타리	50 (사비)	· '02.11. 6 : 공사계약 · '02.11. 8 : 공사착공 · '03. 4.29 : 공사완료	100%	(이월)
2	교통사고 잦은곳 개선 공사	· 가라장리2개소 -경성고 입구 -미포세무서 앞	160 (사비)	· '02.12. 5 : 공사계약 · '02.12. 9 : 공사착공 · '03. 5.14 : 공사완료	100%	(이월)
3	선릉물안길 도로화장 실시계획 용역	· 도로개설 B=10m~15m L=410m	35 (구비)	· '02.11. 7 : 용역실제 착수 · '03. 3. 4 : 용역완료	100%	(이월)
4	동교동길 보도장비공사	· 보도장비 B=3m L=2,000m A=60@	720 (구비)	· '02.11.13 : 공사계약 · '02.11.15 : 공사착공 · '03. 5. 28 : 공사완료	100%	(이월)
5	성산초교외 2개교 통학로장비 (성원초, 성산중등초교)	· 통학로장비 B=2.5m L=850m	380 (구비)	· '02.11.21 : 공사착공 · '03. 4.23 : 공사 완료	100%	(이월)
6	연남동241,245주변 도로장비공사	· 덧외우기 B=6~12m L=350m A=24@	120 (구비)	· '03. 3. 4 : 공사계약 및 착공 · '03. 4.29 : 공사완료	100%	(산규)
7	성산동250~262간 도로장비공사	· 덧외우기 B=6m L=500m A=30@	180 (구비)	· '03. 3. 6 : 공사계약 및 착공 · '03. 5.27 : 공사완료	100%	(산규)

2) 보상 : 1 건 41 백만원(완료)

연번	사업명	공사개요	사업비 (백만원)	추진실적	공정	비고
1	잠두봉사적지소공인조성 보상(공원누자과사업)	· 보상 A=3,959㎡	41 (구비)	· 자장물 1건	100%	(이월)

3. 진행사업

1)보상사업 : 6개 사업 9,811백만원(진행)

구분	연번	사업명	개요	보상예산 (백만원)	사업내용	보상내용	
총계				9,811			
구 비	소계			4,096			
	신규	1	마포동236~305간도로보상	B:6m L:75m	420	도로개설	토지: 10 지장물: 8 영업: 1
		2	원서동(신수동)마을어장 조성 보상(공익복지차)	1,127㎡	700	주민휴식 공간	토지: 469㎡
	계속	3	신수동91~112간 도로보상	B:15m L:210m	700	도로개설	토지: 11 지장물: 2 영업: 1
		4	상수918-5~서교329-11간 도로보상(걸고있는거리)	B:15~45m L: 580m중 20m	2,276	걸고있는 거리조성	철도용지: 24 철도철거차 연계실시 행사이월(2,276)
	소계				5,715		
시 비	신규	5	서강대로~외우마루길접속부 가라정리 사업	B:20m L:100m	265	도로개설	토지: 3 지장물: 1
	계속	6	토정길확장공사(2-3공구)	B:20~23m L:450m중 120m	5,450	도로개설	토지: 77 지장물: 42 영업: 41

2) 도로건설사업 : 총 16 건 14,931.5 백만원(진행)

연번	사업명	공사개요	사업비 (백만원)	추진실적 및 계획	공정	비고
계	26건		14,931.5			
소계	도로개설 : 10 건		5,963			
1	상수동818~서교동829간 도로개설 및 검교설은거위 조성사업(1공구)	· 도로개설 B=15~45m L=580m구간 · 기포등 : 58본 제차간 : 4연	1,270 (사비+구비)	· 1공구 580m중900m완료 · 지하주차장 건설계획에 의거 공사중지 · 지하주차장 건설 취소로 공사중지	50%	(이행)
2	포항길 확장공사 (2-2공구)	· 도로개설 B=20~23m L=500m · 기포등 포함	2,550 (사비)	· 2002.11.9 : 공사착공 · '02.12~'03.3 : 이주특허 및 협의 · '03.4~'03.6 : 포공 및 용역상지	30%	(이행)
3	사갈대로 ~이우미부길 철거부 가라앉혀 공사	· 도로개설 B=20m L=100m	828(사비)	· '03.1~'03.6 : 설계완료 · '03. 7 : 안기표시 · '03.8~'03.12 : 보상시행 · '03.9~ : 공사시행 보상으로 유동액	상계중	(산규)
4	대흥동0-50~0-83간 도로개설(무송의원 소중 진)	· 도로개설 B=6~10m, L=40m	97 (구비)	· 행정소송 재류(고등법인) · 소송결과에 따라 공사중지	50%	(이행)
5	선동물안길 도로확장공사	· 도로개설 B=10m~15m L=410m	500 (구비)	· '03. 4.14 : 1차공사계약 및 착수 · '03. 4~'03.12 : 공사시행 · 잔여예산(600백만원) 추경안정	45%	(산규)
6	삼수동91-508~112 간 도로개설	· 도로개설 B=15m L=210m	530(구비)	· '03.1~'03.4 : 잔여구간 안기표시 · '03.5~'03.7 : 보상시행 및 설계정액 · '03.8~ : 공사시행 보상으로 유동액	상계중	(산규)
7	현악동171-3호 앞내 도로정비공사	· 자갈물 이설 B=0m L=70m	50 (구비)	· '03.1~'03.3 : 유원기관 협의 · '03.4~'03.8 : 이설시행	50%	(산규)
8	환내자갈물 철거공사 (연산간)	· 건물 철거 A=600㎡	100 (구비)	· '03.1~'03.3 : 설계 및 발주 · '03.4~'03.12 : 공사시행	50%	(산규)
9	건설 폐기물 처리 용역 (연산간)	도로 공사와 연계	각 공사장별 정산 시행			
10	선동물안길 도로타설 타당성 조사 용역	· 도로타설 타당성 B=20m L=720m	58 (구비)	· '03. 3.28 : 타당성조사 용역 착수 · '03. 6.23 : 외부전문가 지문회의 · '03. 6.25 : 용역완료 예정	95%	(산규)

〈도로건설사업(진행)〉

연번	사업명	공사개요	사업비 (백만원)	추진실적 및 계획	공정	비고
소계	도로장비 : 9		7,505.5			
11	상산동50~안남동487간 방음벽설치공사	·방음벽 설치 H=3~4m L=296m	1,700 (사비)	·'02.4.8 : 공사착공 ·'02.11.30 : 용역신설 및 하수관설치 ·'02. 6. 30 : 추가구간 용역설치 ·'03. 7. 10 : 공사완료 예정	90%	(이월)
12	공덕동105번지 주변 도로장비공사	·맞아우키 B=4~6m L=1,100m A=36.5@	182.5 (구비)	·'03. 3. 4 : 공사계약 ·'03. 3. 10 : 착공 ·'03. 7. 10 : 완료예정	98%	(신규)
13	방안동497~498간 도로장비공사	·맞아우키 B=12m L=900m A=36@	180 (구비)	·'03.2. 27. 사업유보 (합정·방안동 도로기능검토)	유보	(신규)
14	간사리길 보도장비공사 (기포콘크리트)	·보도장비 B=3m L=2,100m ·기포콘크리트	758 (구비)	·'03.3.27: 공사계약 ·'03.4. 2: 공사착공 ·'03.7. 10: 완료예정	95%	(신규)
15	세방 교차로 보도 및 기포콘크리트 공사	·보도장비 B=3~4m L=800m ·기포콘크리트	357 (구비)	·'03.1~'03.3 : 조사 설계 및 입주 ·'03.3.27~'03.7.24 : 공사시행	95%	(신규)
16	방안동419-2구간 도로용역 보수공사	·용역보수 H=5~10m L=60m A=5.40m	320 (구비)	·'03.1~'03.7 : 설계용역 발주, 시행 ·'03.7~'03.8 : 공사발주 ·'03.9~'03.12 : 공사완료 시행	설계중	(신규)
17	관내 도로시설물 유지보수공사(연차차)	·도로 시설물 유지보수	500 (구비)	·'03.3.8 : 공사계약 ·'03.3.10 : 공사착공 ·'03.12.31 : 완료예정	80%	(신규)
18	관내 포장도로 유지보수공사(연차차)	·포장도로 유지보수	1,500 (구비)	·'03.2.28 : 공사계약 ·'03.3. 3 : 공사착공 ·'03..12 : 완료예정	80%	(신규)
19	관내도로 굴착복구공사 (연차차)	·도로굴착 복구	2,000 (기금)	·'03. 2.17. : 공사계약 및 착공 ·'03. 2.1~'03.12.31 : 공사시행	35%	(신규)

〈도로건설사업(진행)〉

연번	사업명	공사개요	사업비 (백만원)	추진실적 및 계획	공정	비고
소계	도로조영 : 7 건		1,443			
20	대흥로 도로조영 개선사업	가로등 50본	250 (사비)	·'03.1~'03.3 : 한강조사 및 설계발주 ·'03.4~'03.10 : 공시시행	92%	(산규)
21	신촌로 도로조영 개선사업	가로등 22본	150 (사비)	·'03.1~'03.3 : 한강조사 및 설계발주 ·'03.4~'03.10 : 공시시행	70%	(산규)
22	동교동198~서교동480간 가로등 개량공사 (보도장비공사와 병행)	·가로등 개량 52본	160 (구비)	·'03.1~'03.3 : 조사 설계 및 발주 ·'03.4~'03.9 : 공시시행	50%	(산규)
23	잔야길 가로등 개량공사 (보도장비공사와 병행)	·가로등 개량 60본	200 (구비)	·'03.1~'03.3 : 조사 설계 및 발주 ·'03.4~'03.10 : 공시시행	50%	(산규)
24	새창고개길 가로등 개량공사 (보도장비공사와 병행) (도회동)	·가로등 개량 27본	83 (구비)	·'03.1~'03.3 : 조사 설계 및 발주 ·'03.4~'03.12 : 공시시행	40%	(산규)
25	보안동 유지 관리 및 설치공사(연간차)	·보안동 10,240등 유지보수	400 (구비)	·'03.1~'03.3 : 조사 설계 및 발주 ·'03.4~'03.12 : 공시시행	50%	(산규)
26	가로등 유지 관리 및 노후선로 정비(연간차)	·가로등 3,080등 유지보수	200 (구비)	·'03.1~'03.2 : 조사 설계 및 발주 ·'03.3~'03.12 : 공시시행	50%	(산규)

1. 공공용지 점용료 부과 징수

지방재정의 주요재원인 공공용지(도로,하천,구거) 점용료의 정확한 부과 징수로 재정자립도를 높이고, 불법점용자에 대한 변상금부과 등 신규세입원의 발굴로 세외수입증대에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003년 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 공공용지점용료 부과징수(정기,수시분)
- 목표 : 4,000건 2,958백만원(구수입1,558, 시수입1,400백만원)

□ 추진실적

- 2003년 공공용지 점용료 부과징수 실적(2003.4.30현재)
- 2,424건, 2,715백만원
· 시수입 763건 1,499백만원 · 구수입 1,661건 1,216백만원
- 2003년 정기분 공공용지 점용료 체납고지서 발송 : 2003.5월
- 국공유지 전수조사 실시 : 2003.6.1~ 진행중

□ 향후 추진계획

- 정기분 공공용지 점용료 체납원인 분석 및 징수 독려로 고정적 세원관리 만전
- 국공유지 전수조사에 따른 변상금 부과 등으로 신규·탈루 세원 계속 발굴

2. 과년도 공공용지 체납점용료 징수

직원별 체납목표액 배시, 체납고지서 일제송달, 체납자 재산압류 적극시행 등으로 과년도 체납징수에 만전을 기하여 구 세외수입확충에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003년 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 과년도 공공용지 체납점용료 징수
-체납징수대상:4,563건 592백만원 -징수목표:500건 120백만원

□ 추진실적

- 상반기 체납정리기간 설정 운영 : 2003. 4. 1 ~ 5. 31
- 체납점용료 징수 : 117건 71백만원 (2003. 4. 30현재)
- 체납독촉고지서 송달(2회) : 1,750건 360백만원

□ 향후 추진계획

- 하반기 체납정리기간 설정 운영 : 2003. 10. 1 ~ 12. 31
- 재산조회 및 재산압류 적극시행 및 상습체납자에 대한 지속적인 독려

3. 도로점용 시설물 정비 및 관리

도로를 점용하고 있는 각종 시설물에 대하여 일제점검 및 유지관리에 적정을 기하여 쾌적한 도시환경을 조성하고 점용료부과 등 세입원관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003년 1월 ~12월
- 사업내용 : 차량진출입시설, 사설안내표지판 정비 및 관리
 - 관리대상 : 총1,465개소(차량진출입1,049, 사설안내표지판416)

□ 추진실적

- 사설안내표지판 일제정비 방침수립(2003.5월) : 정비대상 230개
 - 관공서,주차시설 60개 - 교육,체육,의료시설 29개
 - 종교시설 73개 - 기타시설(은행,공사등) 68개

□ 향후 추진계획

- 사설안내표지판 일제정비(230개소) : 2003.6.1 ~ 10. 30
- 사설안내표지판 자체정비 구청장공한문 발송 : 2003.11월
- 차량진출입시설 상시점검(1,049개소) : 동담당별 현지출장 지속점검
- 위반사항(면적초과,무허가) 조치 : 원상회복, 변상금부과, 추인허가 등

4. 마포동 236~305간 도로개설보상

장기 미집행 도시계획 도로개설사업으로써 강변북로에서 마포로 진입차량의 국지도로 접근 용이 및 교통 소통의 원활을 위하여 단절구간 도로연결

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 3~ 2004.12
- 사업규모 : 도로개설 B=6m, L=75m
- 사업내용 : 토공420㎡, 배수공75m, 도로포장 4.5@
- 보 상 비 : 420백만원(구비)-신규사업 (장래 : 공사비180백만원)

□ 추진실적

- 2003. 5. 30 : 토지조서 및 물건조사 실시(4. 30 인가고시)

□ 향후추진계획

- 2003. 6 ~ 7 : 시공선 확보(풍농)변경인가고시
- 2003. 7 ~ 8 : 보상계획공고 및 감정평가
- 2003. 9 ~ 12 : 보상협의 및 보상금지급

5. 현석동(신수동)마을마당 조성보상

시민의 건강과 정서생활 향상에 기여할 수 있는 건전한 도시환경 조성 및 주민 휴게공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 2 ~ 2004. 12
- 사업규모 또는 주요내용 : 면적 1,127㎡
- 보상비 : 700 백만원(구비)

□ 추진실적

- 2003. 6. 5 : 도시관리계획 공람.공고

□ 향후추진계획

- 공원녹지와 인가고시후 보상실시

6. 걷고싶은거리 조성사업(상수동318~서교동329간)

풍요롭고 살맛나는 쾌적한 도시환경을 만들기 위해 전통과 문화가 공존하는 걷고싶은 거리를 조성함으로써 주민의 보행권과 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업규모 : 도로개설 B=15~45m, L=1,280m
- 1공구 580m(용산선 철로변~홍대입구), 2공구 700m(홍대입구~대흥로 접속부)
- 주요내용 : 걷고싶은거리조성 및 전시·공연시설등 주민편의시설 설치
- 사업비 : 24,500백만원(시비17,368백만원, 구비7,132백만원)
(기투자13,328백만, 2003명시이월 3,546백만, 장래7,626백만)
- 사업기간 : 1998.5.12~2005.12.31

□ 추진실적 : 1공구580m중 300m 완료

□ 향후 추진계획

- 2003.6.12 : 공사재개
- 2003.12월 : 공사완료예정(1공구)

※ 우리구 재정 여건상 2공구 예산확보가 어려워 서울시에 지속적으로 예산지원 요구중이나 예산지원 불투명 하여 구비에산 확보가 요구됨

7. 토정길 확장공사

서강대로 개통으로 증가되고 있는 교통량 분산 및 지역간 균형 발전 유도

□ 사업개요

- 위 치 : 신석초교~서울화력발전처 간
- 사업규모 : 도로확장 및 개설 B=20~23m, L=1,882m
- 사업비 : 50,730백만원(시비)
(기투자 29,979백만, 2003예산6,000백만, 장래 14,751백만)
- 사업기간 : 1998~2005

□ 추진실적

- 2-2공구 500m구간(공사) : 지장물철거, 토공 및 옹벽설치
- 2-3공구 450m구간(보상) : 실시계획인가 고시

□ 향후 추진계획

- 2-2공구 500m구간(공사) : 2003.12월말 공사완료 예정
- 2-3공구 450m구간(보상) : 감정평가 및 보상 실시

8. 서강대로~와우마루길 가각정리

운전자의 가시거리확보가 어려운 와우마루길 접속부 급경사지의 가각부를 정리함으로써 운전자편의를 도모하여 교통사고예방과 도로구조 개선으로 교통소통에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 1 ~ 2003. 12(난공사로 이월 예상)
- 사업규모 : B=15m, L=100m
- 사업내용 : 시거확보를 위한 가각정리 및 도로구조 개선
- 사업비 : 1,093백만원(시비)
(보상비 : 265백만, 공사비,800백만, 설계비:28백만)

□ 추진실적

- 실시설계 용역 완료
- 실시계획 공람공고(서울시 도로계획과)

□ 향후 추진계획

- 2003.7월 : 공사시행
- 보상과 병행 공사추진하여 2003.12월말 공사완료 목표

9. 선동물천길 도로확장공사

장기 미집행 도시계획 도로개설 사업으로 서강대교 개통에 따른 대흥로, 서강로의 교통분산 및 재개발지역 주변의 도로망 확충으로 지역발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2000.10~2003.12.31
- 사업규모 : 도로개설(확장) B=10→15m, L=410m
- 사업내용 : 토공 3,500㎡, 배수공 820m, 도로포장61.5@
- 사업비 : 1,753백만원(기투자 1153백만원, 추경반영 600백만원)

□ 추진실적

- 2003. 3. 24 : 장기계속공사 발주
- 2003. 4. 14 : 1차 공사계약 및 착수
- 2003. 5~6월 : 지장물 철거 및 하수관 부설 완료

□ 향후 추진계획

- 잔여예산 2003. 추경반영(600백만원)
- 추경예산 반영 여부에 따라 2차공사 발주

10. 산수동 91-508~112간 도로개설공사

장기 미집행 도시계획 도로개설사업으로 서강대교 개통에 따른 대흥로, 서강로의 교통분산 및 재개발지역 진입로 개통에 따른 도로연계성 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2001.7~2004.12.31
- 사업규모 : 도로개설 B=15m, L=210m
- 사업내용 : 토공3,000㎡, 배수공420m, 도로포장31.5@, 가시설1식
- 사업비 : 3,830백만원(구비)
(기투자:보상비2,600백만원, 2003년:1,230백만원)

□ 추진실적

- 실시계획 인가고시 완료
- 실시설계 용역 완료

□ 향후 추진계획

- 2003.7월 : 공사발주
- 잔여구간 보상시행
- 보상과 병행 공사추진하여 2004.상반기 공사완료

11. 선동물천길 도로터널 "타당성조사용역" 시행

배수처리용으로 일제때 건설된 선동물천길 하수터널에 대한 도로터널 타당성 조사용역을 실시, 사업시행 여부를 검토 분석하여 마포대로와 대흥로 간의 아현·염리동 일대의 고지대 교통망을 확충하므로써 마포로 교통량을 분산시켜 교통체증을 해소함과 아울러 마포문화센터 이용율을 제고코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 아현동613-7(마포경찰서 뒤)
~ 염리동36-249(마포문화체육센터 앞)
- 사업규모 : B=20m, L=720m
- 사업내용 : 도로터널사업시행 여부 결정을 위한 "타당성조사"용역시행
- 용역비 : 58백만원

□ 추진실적

- 2003. 2. 26 : 용역 발주
- 2003. 3. 28 : 타당성 조사용역 계약 및 착수

□ 향후 추진계획

- 2003. 6.23 : 외부전문가 기술자문회의 개최
- 2003. 6.25 : 용역 완료 예정

12. 잔다리길 보도정비공사

주택가주변 사각보도브럭의 노후 및 요철로 인한 주민 보행불편과 도시미관을 저해하고 있는 보도 정비 및 가로등 조도개선으로 쾌적한 보행로 확보 및 주민속원 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 1 ~ 9. 30
- 사업규모 : 보도정비(B=3m, L=2,100m, A=63@)
가로등 개량 60본
- 사업내용 : 노후 보도브럭 정비 및 가로등 조도개선
- 사업비 : 956백만원(구비)-(가로등 200포함)

□ 추진실적

- 2003. 1~2월 : 설계및공사발주
- 2003. 3. 27 : 공사 계약
- 2003. 4~6월 : 공사시행

□ 향후추진계획

- 2003. 7. 10 : 공사완료예정

13. 새창고개길 보도 및 가로등 정비공사

주택가주변 노후 및 요철 보도블럭으로 인한 주민 보행불편과 도시미관을 저해하고 있는 보도블럭 정비와 노후 가로등 조도개선으로 쾌적한 보행로 확보 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 3.27 ~ 7.24
- 사업규모 : 보도정비(B=3~4m, L=800m)
가로등 개량 27등
- 사업내용 : 노후 보도블럭 정비 및 가로등 조도 개선
- 사업비 : 450백만원

□ 추진실적

- 토공 및 보도블럭 포장완료
- 가로등 기초 및 지주설치

□ 향후추진계획

- 가로등설치
- 2003.7월 공사완료예정

14. 합정동 419-2주변 도로옹벽공사

주택가주변 노후 불량 도로옹벽에 대한 사전 보수조치로 안전사고 미연 방지와 구조물의 수명연장은 물론 도시미관 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 1 ~ 12. 30
- 사업규모 : 합정동 수정교회 앞 도로옹벽 보수
(H=8~10m, L=60m, A=540㎡)
- 사업내용 : 노후 불량 도로옹벽 보수
- 사업비 : 320백만원(구비)

□ 추진실적

- 정밀안전진단 및 기술자문 완료

□ 향후추진계획

- 2003. 7월 : 실시설계
- 2003. 8월 : 공사발주
- 2003. 12월 : 공사완료 예정

15. 합정·망원동 관내 도로기능 개선 및 정비 계획

- 합정·망원지역은 주 도로인 포은길(합정동), 한마음길(망원동)이 협소하여 교통정체가 날로 심각해지고 있는 지역으로
- 이에 대한 해소대책의 일환으로, 도로 폭원은 넓으나 단절되어 통과도로의 기능이 상실된 인근블록의 회우정3길·한가람길·망원유수지·방울내길의 단절된 도로망을 접속 및 연결시키고 병목구간 및 불합리한 가각은 확장 및 전제하여 도로기능을 개선·정비함으로써
- 차량소통에 원활을 기하고 보행안전과 지역간 균형발전에 이바지하고자 함

□ 대 상

- 망원·합정동 지역의 회우정3길~한가람길~망원유수지~방울내길

□ 개선방향

- 단절된 회우정3길(도로폭 15m)을 양화대교 북단I.C 램프도로와 연결하여 포은·한마음길의 교통량을 우회 분산
- 회우정3길의 연장선상에 있는 한가람길과 방울내길과의 도로신설 연결 (망원유수지 부분복개 B=12~20m)
- 회우정3길 병목구간 확장(B=9m→15~18m)
- 노외 주차장설치 : 망원유수지 부분복개(200대분 : 35m*140m)

□ 추진경위

- 2002.11.25 : 합정·망원 도로기능 검토계획 방침
- 2002.11.26 : 합정·망원 도로기능 검토 관련부서 협의
- 2003. 2. 6 : 합정·망원 도로기능 검토보고
- 2003. 4. 21 : 망원 유수지 이용계획 검토보고
- 2003. 5. 30 : 도시계획시설(도로,주차장)결정방침 및 결정의뢰

□ 소요예산 : 14,297백만원(구비 : 7,651백만, 시비 6,646백만)

- 도로 개설 및 정비 : 8,154백만원
- 주차장건설 : 5,443백만원
- 녹지 조성 : 700백만원

□ 향후 추진계획

- 2003. 6월~ : 도시계획시설(도로,주차장)결정 절차이행
- 2003. 하반기 : 단계별 설계용역 결과에 따라 재정 투·융자심사
재정 투·융자 심사결과에 따라 예산조치 요구
- 2004. 상반기 : 예산이 확보되는 대로 사업 본격시행

치수과

(48명)

□ 인력현황

(2003. 6. 30 기준)

구분	계	일반직						기능직	지도원
		4급	5급	6급	7급	8급	9급		
정원	45	-	1	5	4	6	3	25	1
현원	48		1	5	4	6	3	28	1

※ 상용직 16명

□ 장비현황

장비명	준설기	작압기	갓타기	차량	펌프차	비고
수량	7조 (14대)	2대	1대	2대	1대	

□ 하수·치수 시설 현황

(2003. 6. 30 기준)

하수 시설						치수 시설			
관거	암거	L형측구	맨홀	빗물받이	횡단하수거	펌프장	펌프	수문	유수지면적
366,932m	28,723m	6,285m	8,170개	14,400개	30개/506m	10개소	53대	23개소/50문	432,804㎡

2003년 치수 및 하수사업 총괄 현황

□ 사업개요

- 총 28건 25,269 백만원
 - 시 비 : 10건 21,146백만원 (83%)
 - 구 비 : 18건 4,123백만원 (17%)

□ 사업내용

계	하수관계 종합장비	하수관 개량장비	하수처리 증설장비	용역	펌프장 정리	펌프장 증설	유수지 체육공원 조성	빗물받이 준설	당배아	기타
28건	3	6	3	2	6	1	1	1	2	3

※ 기타 : 긴급맨홀복구, C.C.T.V.관로조사, 악취저감

□ 사업비 내용

(단위 : 백만원)

구분 \ 사업비	총 사업비		구 비		시 비	
	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
총 사업비	28	25,269	18	4,123	10	21,146
하수사업	19	17,080	13	3,198	6	13,882
치수사업	9	8,189	5	925	4	7,264

□ 추진실적

- 사업완료 : 11건 1,153백만원
- 진행중 : 17건 24,116백만원

2003년 치수 및 하수사업 추진계획

□ 하수사업

(단위 : 백만원)

구분	연번	사 업 명	공 사 개 요	사업비	공사기간	공정 (%)	비고
합 계		19건	L=13,769 m	17,080			
시비	소계	6 건	L= 10,659m	13,882			
	1	창전배수분구 하수관거 종합정비	D=450~700m/m L=904m	753	2003.3. ~12.31	13	
	2	망원배수분구 하수관거 종합정비	D=300~1,000m/m L=4,612m	3,039	"	50	
	3	아현배수분구 하수관거 종합정비	D=450~1,000m/m L=2,428m	1,620	"	19	
	4	동교, 서교동일대 침수방지시설	하수암거 증설 □3.0m×2.0m ~2.5 ×2.8m L=2,550m	8,000	2003.10. ~ 2005.6.	-	
	5	미포유수지유입암거 외 1개소 보수·보강공사	하수암거 단면보수 A=861㎡	400	2003.3. ~ 10.31	70	
	6	경성중고교앞 하수 암거 보수보강공사	하수암거 보수·보강 □1.8m×1.6m 2현 L=165m	70	2003.3. ~ 6.30	100	
구비	소계	13 건	L= 3,110m	3,198			
	7	관내 하수도 준설공사	하수도 준설 V=5,885㎡	900	2003.3. ~12.31	73	
	8	관내 하수시설 보수공사	D=300~1,200m/m L=1,682m	900	"	72	
	9	상수동325-78 반지 일대하수관 개량공사	D=600~1,100m/m L=253m	200	2003.3 ~ 9.30	100	
	10	서교동346번지 외 1개소하수관 개량공사	D=600m/m L=150m	200	2003.8 ~11.30	-	
	11	공덕동118번지일대침수방 지대책 기본및 실시설계	1 식	50	2002.3 ~ 7.31	70	
	12	성산2동 200의 243~ 247지하수관 개량공사	D=800m/m L= 86 m	80	2003.3. ~7.31	100	
	13	열리동 27번지 일대 하수관개량공사	D=600~800m/m L=388m	320	2003.3. ~9.30	100	
	14	공덕동105번지일대 하수관정비공사	D=900~1,000m/m L=145m	203	2003.3. ~9.30	100	
	15	성산동 94~115번 지간하수관정비공사	D=800m/m L=100m	155	2003.3. ~6.30	100	
	16	하수도 맨홀복구비	N=100 개소	30	2003.3. ~ 12.31	100	
	17	관내 빗물받이 연결관 준설	N=2,030 개소	100	2003.3. ~ 12.31	16	
	18	약취 저감사업	N= 300 개소	30	2003.3. ~12.31	100	
19	하수관로 C.C.T.V. 조사비	L= 3.4 km	30	2003.3. ~12.31	25		

□ 치수사업

(단위 : 백만원)

구분	연번	사업명	공사개요	사업비	공사기간	진행률 (%)	비고
합계		9건		8,189			
시비	소계	4건		7,264			
	1	망원유수지체육시설 조성공사	○도수로정비 705m ○포장공 505a ○체육시설 26개소 ○주차장 및 광장등	1,100	2000.9 ~ 2003.12.	72	
	2	망원1 빗물펌프장 증설공사	○펌프증설 800HP× 3대(300m ³ /min)	4,264	2003.9. ~ 2005.5	-	
	3	수방시설물 (빗물펌프장) 원격 감시 제어 시스템 구축	○펌프장 : 5개소 (상수, 당인, 합정, 성산, 중동)	1,050	2003.6.2 ~ 2003.12.30	2	
	4	남지빗물펌프장 제진설비 개량	○로타리식 자동제진기 (스크린포함) 7대 ○협잡물 콘베어 1대	850	2003.4.3 ~ 11.30.	5	
구비	소계	5건		925			
	-	망원유수지 체육시설 조성사업	○도수로정비 705m ○포장공 505a ○체육시설 26개소 ○기타 1식	570	2000.9 ~ 2003.12.	72	
	3	빗물펌프장 유지관리	○빗물펌프장 10개소	100	2003.3 ~ 12.31	70	
	4	성산유수지 바닥정비	○면적 700 m ²	24	2003.3 ~ 6.30	100	
	5	수문 도색	○수문 22개소 ○스크린 10개소	20	2003.3 ~ 5.31	100	
	6	수문외부 카바 교체	○수문 7개소	21	2003.3 ~ 5.31	100	
	7	망원유수지체육시설 조성공사(감리비)	○ 1식	190	2003.1 ~ 2003.12.	72	

2003년 주요업무 추진실적 및 계획

1. 창전배수분구 하수관거 정비공사

노후 하수관거를 정비 하므로써 토양 오염 예방과 불명수 유입방지로 하수처리 효율을 증대하고 통수단면을 확보하여 배수구역내 상습 침수등 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 정비
 - D=450~700mm, L=904m
- 사업기간 : 2003. 2. 28 ~ 2003. 12. 31
- 사업비 : 753백만원(시비)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30 현재 공정 : 13%
- 굴착 정비공사 착공 : 2003. 2. 28
- 굴착 정비공사 완료 : 2003. 5. 27
 - D=450~600mm, L=108m
 - 굴착공사비 : 96백만원

□ 추진계획

- 비굴착 정비공사 발주 및 공사시행 : 2003. 8 ~ 2003. 12
 - D=450~700mm, L=796m
 - 공사비 : 657백만원
- ※ 서울시에서 비굴착 정비의 공사원가 재조정을 위한 용역 시행중으로 용역결과에 의거 하반기 공사발주 예정.

2. 망원배수분구 하수관거 정비공사

노후 하수관거를 정비 하므로써 토양 오염 예방과 불명수 유입방지로 하수처리 효율을 증대하고 통수단면을 확보하여 배수구역내 상습 침수등 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 정비
D=300~1,000mm, L=4,612m
- 사업기간 : 2003. 3. 17 ~ 2003. 12. 31
- 사업비 : 3,039백만원(시비)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30현재 공정 : 50%
- 굴착 정비공사 착공 : 2003. 3. 17
- D=450~900mm, L=1,012m
- 비굴착 정비공사 착공 : 2003, 3, 21
- D=450~1,000mm, L=617m
* 공사 원가 계산을 위한 부분발주
- 굴착 정비공사 완료 : 2003. 6. 30.

□ 추진계획

- 비굴착 정비공사 발주 및 공사시행 : 2003. 8 ~ 2003. 12
- D=450~1,000mm, L=2,983m
- 공사비 : 1,449백만원
* 재조정된 공사원가에 의거 하반기 발주 예정.

3. 아현배수분구 하수관거 정비공사

노후 하수관거를 정비 하므로써 토양 오염 예방과 불명수 유입방지로 하수처리 효율을 증대하고 통수단면을 확보하여 배수구역내 상습 침수등 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 정비

D=300~1,000mm, L=2,428m(2003년)

- 사업기간 : 2003. 3. 18 ~ 2003. 12. 31

- 사업비 : 1,620백만원(시비)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30현재 공정 : 19%

- 굴착 정비공사 착공 : 2003. 3. 18

- D=450~600mm, L=489m 사업비 :

- 굴착 정비공사 시행중 : L=489m중 350m완료

- 굴착 공사비 : 310백만원

□ 추진계획

- 굴착 정비공사 완공 예정 : 2003. 10. 15

- 비굴착 정비공사 발주 및 공사시행:2003. 8 ~ 2003. 12

- D=450~1,000m, L=1,939m

- 공사비 : 1,310백만원

※ 재조정된 공사원가에 의거 하반기 공사발주 예정.

4. 서교·동교동일대 침수방지시설 및 망원1빗물펌프장 증설공사

최근 빈번하게 발생하고 있는 집중호우시 집단침수가 발생한 서교·동교동의 침수방지를 위해 하수암거를 증설하고 망원1빗물펌프장 배수처리 용량을 증설하여 상습침수 해소등 침수 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수암거설치 □3.0×2.0~2.5×2.8m, L=2,550m
망원1빗물펌프장 증설 800HP×3대
- 사업기간 : 2002. 12. 20 ~ 2005. 6. 30
- 사업비 : 27,309백만원(시비)
(기투자 : 626, 2003년예산 : 12,264, 장래 : 14,419)

□ 추진현황

- 실시설계용역 착공 : 2002. 12. 20
- 실시설계용역 완료 예정 : 2003. 7.
- 용역비 : 626백만원

□ 추진계획

- 조달청 계약 의뢰 : 2003. 8
- 공사 시행 : 2003. 10 ~ 2005. 6

5. 마포유수지 유입암거 외 1개소 보수·보강공사

정밀안전진단 용역결과 마포유수지 유입암거가 노후되어 보수·보강공사가 필요한 것으로 조사되어 구조물의 내구연한 증대와 안전사고 예방을 위하여 정비공사를 시행코자함.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수 암거 단면 보수 - A = 861㎡
 - 2.4×2.8m 3련 L = 664m
 - 3.6×2.0m 2련 L = 102m
- 사업기간 : 2003. 3 ~ 2003. 9. 21
- 사업비 : 400백만원(시비)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30현재 공정 : 70%
- 공사 착공 : 2003. 3. 22
- 공사 시행중 : 보수면적 861㎡ 중 600㎡ 완료

□ 추진계획

- 보수·보강공사 완료 예정 : 2003. 9. 21

6. 관내 하수도 준설공사

관내부에 퇴적된 토사를 준설하여 오수 정체 해소로 악취저감 및 배수 처리를 원활하게 하고 통수단면을 확보하므로서 침수등 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 준설 V = 5,885㎡
- 사업기간 : 2003. 3 ~ 2003. 12. 31(연간단가)
- 사업비 : 900 백만원(구비)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30 현재 공정 : 73%
- 공사 착공 : 2003. 3. 10
- 공사 시행중 : 계획물량 V=5.885㎡ 중 4,300㎡ 완료(연간계획 물량의 73%)

□ 추진계획

- 연간단가 계약에 의거 연중 계속공사 시행.
- 공사 완료 예정 : 2003. 12. 31

7. 관내 하수시설 보수공사

하수시설물 기능 유지로 배수처리를 원활히하여 수해를 예방하고 소규모 하수시설물 파손의 신속한 조치 및 각종 민원 조기 해결로 주민 불편사항 해소.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 긴급 보수(개량)
D = 200 ~ 1,200mm L = 1,682m
- 사업기간 : 2003. 3 ~ 2003. 12. 31(연간단가)
- 사업비 : 900백만원 (구비)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30 현재 공정 : 72%
- 공사 착공 : 2003. 3. 3
- 공사 시행중 : 연간계획물량 1,682m 중 1,208m 완료

□ 추진계획

- 연간단가 계약에 의한 공사로 연중공사 시행
- 공사 완료 예정 : 2003. 12. 31

8. 신수동325-78번지 일대 하수관개량공사

기존 하수관경이 협소하고 통수단면이 부족하여 관경 확장 개량하고 하수관로 위치를 변경하여 상습침수 지역인 신수동 250번지 일대 수해를 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 관경 개량 및 확장 (L = 253m)
 - D = 600~700mm L = 211m
 - D = 800→1,100mm L = 42m
- 사업기간 : 2003. 3. 20 ~ 2003. 8. 16
- 사업비 : 200백만원(구비)

□ 추진현황

- 공정 : 100%
- 공사착공 : 2003. 3. 20
- 공사완료 : 2003. 6. 15

9. 서교동346번지 외 1개소 하수관 개량공사

하수관이 노후되고 침하되어 통수단면 부족으로 인한 침수가 발생된 지역으로 하수관을 교체하여 안전사고 및 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 개량
- D = 600 ~ 700mm L = 237m
- 사업기간 : 2003. 8 ~ 2003. 11. 30
- 사업비 : 200백만원(구비)

□ 추진현황

- 설계 완료 및 공사발주 : 2003. 6. 16.

□ 추진계획

- 공사 착공 예정 : 2003. 7
- 공사 시행 : 2003. 8 ~ 2003. 11

10. 염리동 27번지 일대 외 1개소 하수관 개량공사

노후된 하수관 교체로 안전사고 및 하수 누수에 의한 토양오염 예방과 통수단면 확보로 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 개량
- D = 600 ~ 800mm L = 388m
- 사업기간 : 2003. 3. 14 ~ 2003. 7. 22
- 사업비 : 320백만원(구비)

□ 추진현황

- 공정 : 100%
- 공사 착공 : 2003. 3. 14
- 공사 완료 : 2003. 6. 25

11. 공덕동 105번지 일대 하수관 정비공사

도로폭이 협소하고 일부 사유지에 있는 노후된 하수관의 내부를 보수 보장하여 안전사고 및 하수 누수에 의한 토양오염 예방과 통수단면 확보로 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 정비 (비굴착 보수)
- D = 900~1,000mm L = 145m
- 사업기간 : 2003. 3. 14 ~ 2003. 6. 12
- 사업비 : 203백만원 (구비)

□ 추진현황

- 공정 : 100%
- 공사 착공 : 2003. 3. 14
- 공사 완료 : 2003. 5. 29

12. 성산동 94~115번지간 하수관 정비공사

하수관이 침하되고 통수단면 부족으로 인한 침수지역이 발생되어 하수관을 정비하여 단면 확보 및 배수처리 효율 증대로 수해 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 하수도 정비 (비굴착 정비)
- D = 800mm L = 100m
- 사업기간 : 2003. 3. 24 ~ 2003. 6. 24
- 사업비 : 155백만원 (구비)

□ 추진현황

- 공정 : 100%
- 공사 착공 : 2003. 3. 14
- 공사 완료 : 2003. 6. 5

13. 관내 빗물받이 연결관 준설

간선도로상의 빗물받이 및 연결관에 대한 준설을 신기술을 보유한 전문 업체에 위탁 시행하여 관경 협소, 나무 뿌리등으로 준설이 불가능한 빗물받이 연결관을 준설 관리하여 도로 및 주택 침수 예방.

□ 사업개요

- 사업규모 : 빗물받이 준설 (연간단가)
N = 2,030개소
- 사업기간 : 2003. 2. 28 ~ 2003. 12. 31
- 사업비 : 100백만원 (구비)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30 현재 공정 : 16%
- 공사 착공 : 2003. 2. 28
- 공사 시행중 : 총2,030개소 중 330개소 완료

□ 추진계획

- 연간단가계약 공사로 계속 공사시행
- 공사 완료 예정 : 2003. 12. 31

14. 망원유수지 체육시설 조성공사

망원유수지내 오수정체, 잡초생장, 악취발생, 토사퇴적 등으로 주변 환경에 나쁜 영향으로 인근 주민들의 민원 요원이 되고 있으므로 유수지 바닥을 정비, 체육시설을 조성하여 편익공간 및 생활 환경을 개선코자함.

□ 사업개요

- 사업규모 : 도수로 설치 705m, 포장 505a, 체육시설 26면, 주차장 5,477㎡, 광장 10,116㎡, 조정 1식
- 사업기간 : 2000. 9. 5 ~ 2004. 1. 19
- 사업비 : 9,300백만원 (시비6,510 구비2,790백만원)
(기투자 : 5,553 2003년 : 1,860 장래 : 1,887백만원)
 - 2003년도 사업비(1,860백만원)
 - 시비 : 1,100백만원
 - 구비 : 760백만원(사업비 570백만원, 감리비 190백만원)

□ 추진현황

- 2003. 6. 30 현재 공정 : 72%
- 도수로 설치 705m 완료
- 부지 정지 토공 54,806㎡ 완료
- 맹암거 설치 2,780m 완료
- 호안블럭, 산책로조성, 체육시설 포장공사중

□ 추진계획

- 우기철후 체육시설 포장공사 마무리 : 2003. 11. 30
- 수목식재 등 부대공사 완료 : 2003. 12. 10
- 공사 준공 : 2004. 1. 19

15. 지하수 수질검사 및 이용실태조사

우리구 지하수 시설에 대한 수질검사 및 이용실태조사를 실시하여 수질 현황 및 오염원 조사 기타 각종 자료를 수집, 지하수 관리에 만전을 기하여 깨끗한 지하수를 보존하고자 함.

□ 사업개요

- 사업규모 : 지하수 이용공 304개소
 - 수질검사 : 년1회 의무적으로 시행
 - 이용실태조사 : 지하수 시설제원, 사용실태, 수위, 출수량 등
- 사업기간 : 2003. 1 ~ 12월
- 사업비 : 비예산 사업

□ 추진실적

- 수질 조사 : 130개소 완료
- 이용실태조사 : 165개소 완료

□ 추진계획

- 연중 계속사업으로 2003. 12 말까지 완료 예정.

16. 2003년 수방대책

- 예방 중시 방재업무의 강화 - 인명피해 최소화
- 지역 자주 방재체제의 구축 - 권한과 책임이 일치하는 방재체제 구축
- 완벽한 수해상황 대처 - 신속한 대처로 피해 확산 방지
- 방재업무의 과학화 - 전산장비 도입으로 체계적 복구 및 신속 대응태세 유지

□ 사업개요

- 추진기간 : 2002. 6. 15 ~ 10. 15 (4개월)
- 대책반 편성 : 6개반 64명(24개동 수방단)

□ 추진현황 및 계획

- 수방시설(빗물펌프장) 자동화
 - 1단계 사업 완료(마포,봉원,망원1,망원2,난지) : 2003. 5. 10
 - 2단계 사업 추진(상수,당인,합정,성산,중동) : 2003. 12. 30
- 수방시설 점검·정비·시운전
 - 펌프장 및 수문 : 제작사 및 전문기관 정밀점검완료 2003.1~3.
 - 지적사항 조치 및 정비공사 시운전 완료 : 2003. 6. 10
- 수방관련 사업 조기 완료
 - 하수관 개량 정비 : 9건 완료
 - 하수도 준설 : 6,800m³ (연간 목표량의 75%로 초과달성)
- 수해 항구 대책 사업 추진
 - 서교,동교동 일대 침수방지시설 및 망원1빗물펌프장 증설공사
 - 사업기간 : 2002. 12. 20 ~ 2005. 6
- 수방대책 운영 내실화
 - 강우 예보에 따른 자동근무 태세 확립
 - 각종 자재 확보, 장비 및 인력 동원으로 신속한 응급조치 및 피해 복구 실시
 - 빗물 펌프장, 수문등 수방시설의 사전점검, 정비를 조기에 철저히 시행하고 적기 가동으로 피해발생 사전방지 및 최소화
